

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN**

Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux			
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000			
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS			
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullles			
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie		SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture		SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux		SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie		SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité		DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°9 DU 26 JUIN 2023		TRANSMIS LE 27 JUIN 2023			
PROCHAINE REUNION :		LUNDI 10 JUILLET 10H			
Présents	Pres.	Abs			
M. Le Maire ou ses représentants			M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac			Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac			M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	oui	non
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier		X	Entreprise Soulier	X	
Entreprise Martin LG			Entreprise Martin LG		
Entreprise Graille		X	Entreprise Graille	X	
Entreprise Delestre			Entreprise Delestre	X	

Maître d'Ouvrage :

L'ensemble du mobilier a été déposé, à l'exception de l'antependium, de deux sièges, de deux bancs et de l'harmonium en charge de la mairie.

Administratif :

Avenant lot vitrail en attente de retour signé

Planning :

Semaine 26/27

- Pose des pierres au droit du clocher Sud
- Piquage des joints ciments en sol et des enduits ciment en soubassement.

Semaines 28/29

- Suite à validation des travaux, dépose des échafaudages coté Sud compris remontage coté intérieur
- Dépose des installations électriques compris démontage des lustres en conservation
- Poursuite du piquage des joints ciments en sol et soubassement

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

- Achèvement du rejointoiement en façade Sud
- Pose des pierres au droit du contrefort du chevet et en cours au droit de l'élévation Sud du clocher
- Transmission plan échafaudages et platelage intérieurs pour validation avant mise en oeuvre

Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4 :

Lot 5 :

Lot 6 :

TRAVAUX A REALISER

Lot 1 :

Semaines 26/27

- Terminer la reconstruction du parement ext. Du clocher en laissant visible l'ancien arc
- Reconstituer parement intérieur : le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin
- Confortation du clocher et des glacis Ouest compris remplacement de pierre
- Patine sur pierres neuves
- Piquage des joints ciment en sol et en soubassement

Semaines 28/29

- Suite à validation lors de la prochaine réunion de chantier, dépose des échafaudages au droit de l'élévation Sud et de l'élévation Ouest jusqu'aux glacis des contreforts, en concertation avec le lot n°2 pour la pose de la descente EP coté Sud
- Poursuite du piquage des joints ciment en sol et en soubassement

Semaine 28

- Installation échafaudages intérieurs

Semaines 29/30

- Piquage des enduits ciment en élévation et au droit des voûtes des chapelles.

En parallèle

- Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquées par le remplissage. Le réglage se fera suite à la dépose des échafaudages.
- Reprise des glacis Ouest

NB : Laisser en attente les élévations du chevet dans la sacristie en attente si besoin d'équilibrer le point financier

Lot 2 :

- Pose de la descente EP coté Sud en coordination avec la dépose des échafaudages

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.

Lot 4 :


- **Restauration des portes mi-avril**

Lot 5 :


- Dépose des installations prévues à partir de la semaine 26

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.

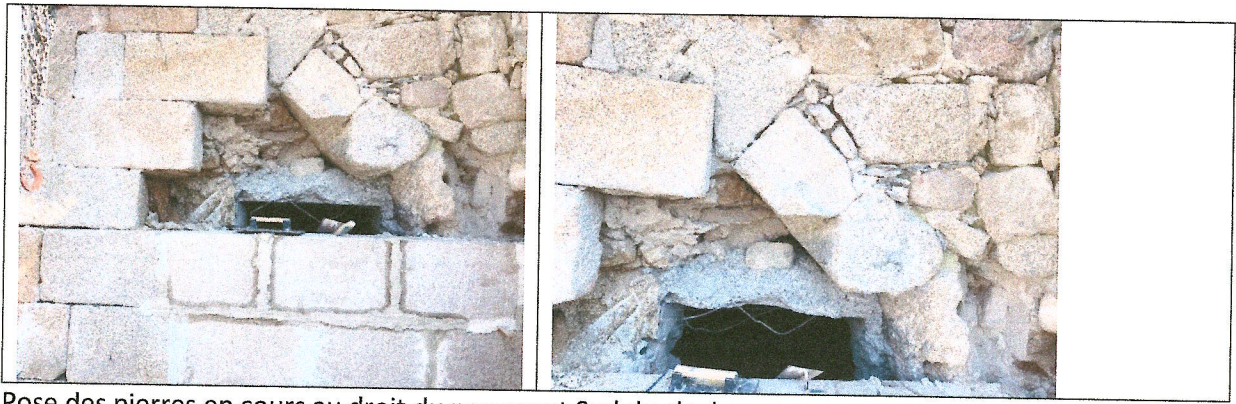


Pose des pierres en cours au droit du parement Sud du clocher

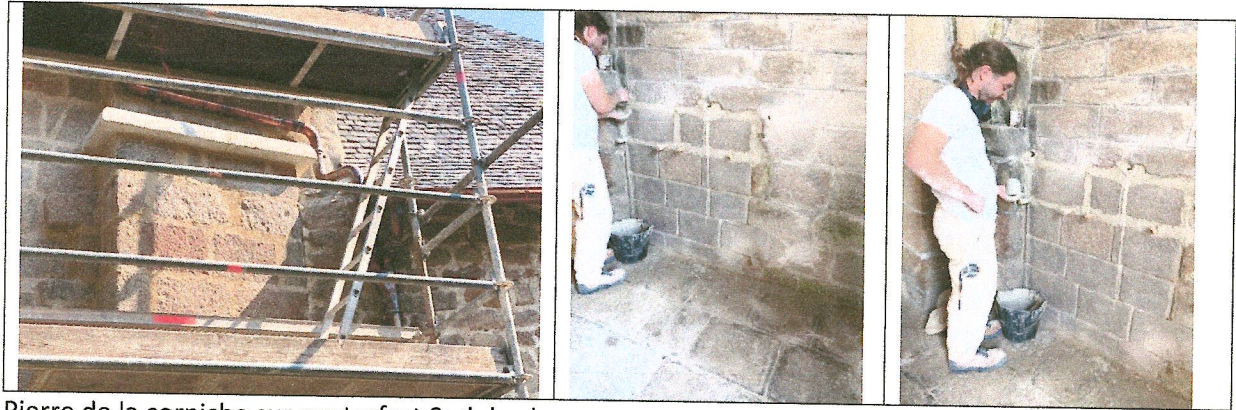

Pierre de la corniche sur contrefort Sud du chœur

Reconstruction en cours du parement intérieur : le rejointoiement se fera en phase 2 en continuité de l'ensemble du parement compris taille des arêtes et patine si besoin.

Etude de principe – échafaudage intérieur

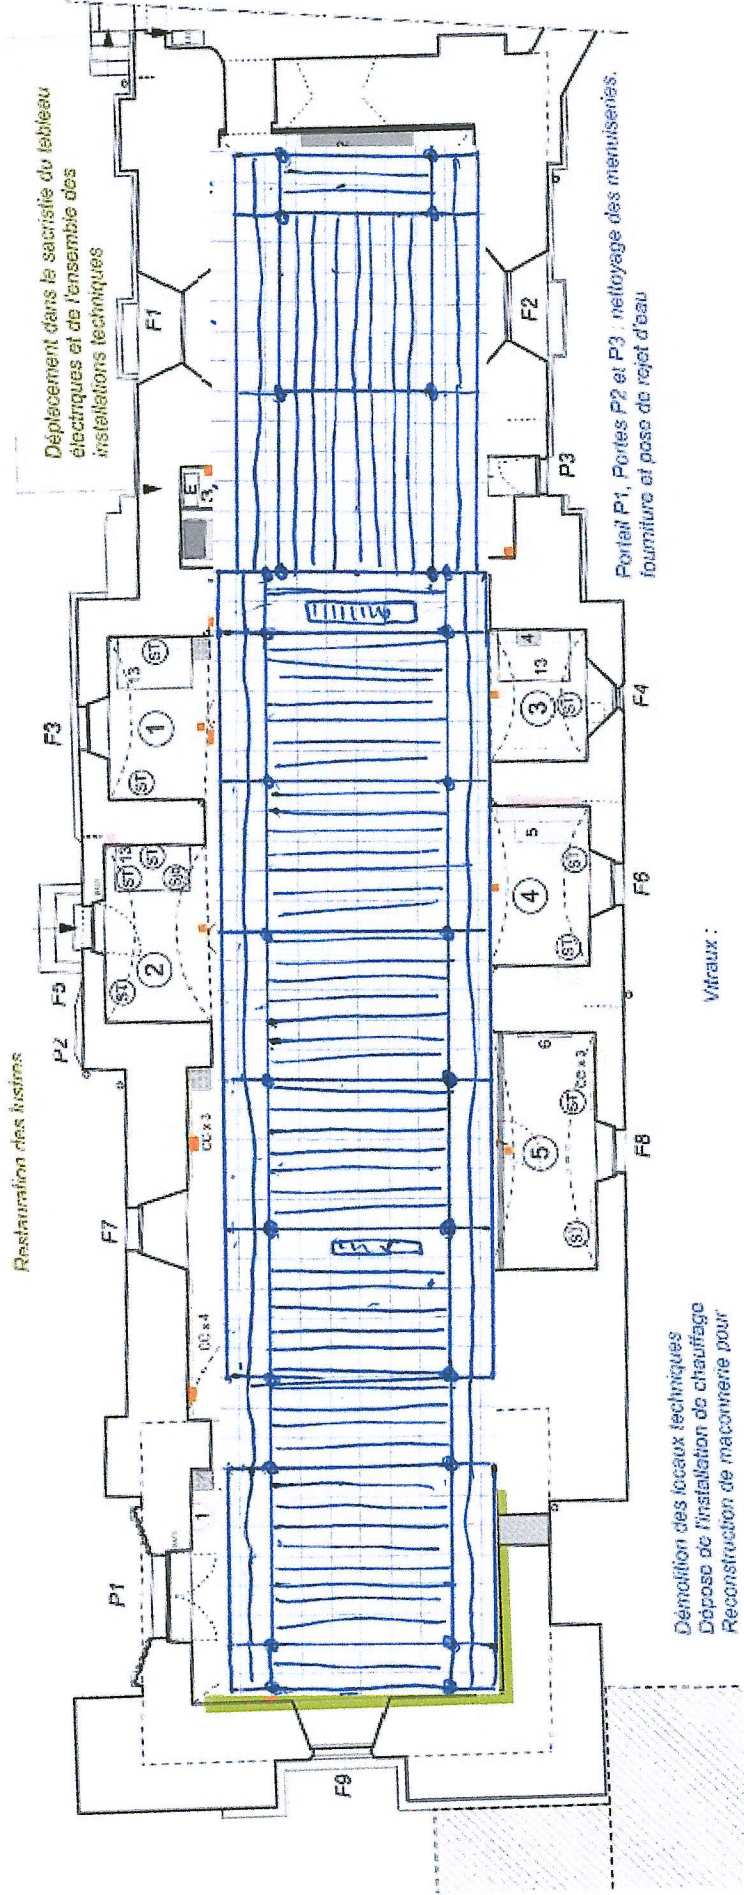

LABATISTE ST GEORGE

Embase x 28

Colle x 28

Verrin x 28

Poteau 200 x 90

Poteau 50 x 64

moisc 300 x 82

moisc 250 x 60

moisc 150 x 12

moisc 100 x 16

moisc 70 x 38

plandre 70 x 8

Pu 300 x 2

Pu 250 x 14

Pu 150 x 2

Pu 100 x 4

Pu 70 x 56

diago 300 x 9

diago 250 x 3

plancher 300 x 92

plancher 250 x 46

plancher 150 x 2

plancher 100 x 16

Trappe 300 x 4

Trappe 250 x 8

planchon 300 x 8

planchon 150 x 2

plinthe 300 x 14


plinthe 250 x 22

plinthe 150 x 4

feuille etc...

2'30.m

2 m

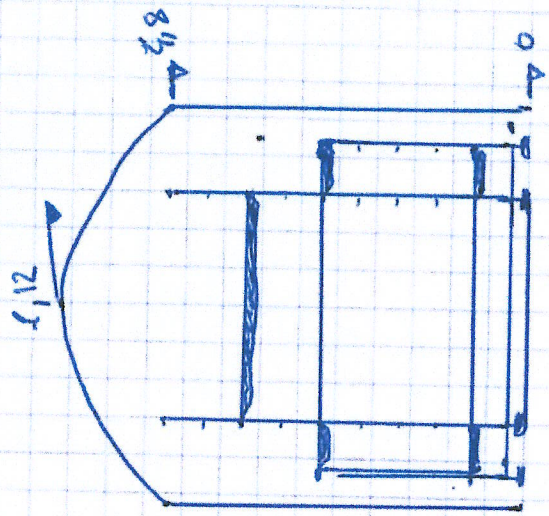

0'73 3'07 0'73

973 3'07 1'57 2'57 2'57 2'57 2'57 1'03

