

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°10 DU 10 JUILLET 2023			TRANSMIS LE 10 JUILLET		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 24 JUILLET 10H		
Présents	Pres.	Abs			
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac			Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac			M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	oui	non
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier		X	Entreprise Soulier	X	
Entreprise Martin LG			Entreprise Martin LG		
Entreprise Graille	X		Entreprise Graille	X	
Entreprise Delestre		X	Entreprise Delestre	X	

Maître d'Ouvrage :

L'ensemble du mobilier a été déposé, à l'exception de l'antependium, de deux sièges, de deux bancs et de l'harmonium en charge de la mairie.

A noter que la mairie n'a pas réussi à déposer l'antependium qui est fixé au mur.

Il convient de remiser hors du chantier la clôture de la chapelle Sud/Ouest

Administratif :

Avenant lot vitrail en attente de retour signé

Planning :

Semaines 28/29

- Pose des pierres au droit du clocher Sud
- Piquage des joints ciments en sol et des enduits ciment en soubassement.
- Suite à validation des travaux, dépose des échafaudages coté Sud compris remontage coté intérieur

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

- Pose des pierres au droit du contrefort du chevet et en cours au droit de l'élévation Sud du clocher
- Transmission plan échafaudages et platelage intérieurs pour validation avant mise en œuvre
- Piquage des soubassements ciment et purge des joints ciment au sol
- Reconstruction du parement intérieur au droit des anciens percements du chauffage: le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin

Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

Lot 5:

- Dépose des installations électriques et des lustres

Lot 6:

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 28/29

- Terminer la reconstruction du parement ext. du clocher en laissant visible l'ancien arc. La taille sur les pierres neuves devra être légèrement accentuée. La pierre de forme trapézoïdale coupée.
- Confortation du clocher et des glacis Ouest compris remplacement de pierre
- Patine sur pierres neuves
- Poursuivre le piquage des joints ciment en sol et en soubassement,
- Dégagement de l'occultation cimentée dans la nef
- Dépose habillage professionnel pour mise au jour linteau bois dégradé compris étaie
- En élévations les premiers sondages ont révélés des vestiges très tenus de décors qui seront dégagés avec précautions et conservés jusqu'à la prochaine visite des services culturels de l'Etat.

Semaines 30/30

- Suite à validation lors de la prochaine réunion de chantier, dépose des échafaudages au droit de l'élévation Sud et de l'élévation Ouest jusqu'aux glacis des contreforts, en concertation avec le lot n°2 pour la pose de la descente EP coté Sud.
NB : les échafaudages ont été validés par M. Graille, il faut toutefois que les parties latérales du platelage soient plus hautes (1m au lieu de 50 cm) et les plateaux supérieurs réglés.
- Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage. Le réglage se fera suite à la dépose des échafaudages.
- Reprise des glacis Ouest

NB : Laisser en attente les élévations du chevet dans la sacristie en attente si besoin d'équilibrer le point financier

Lot 2 :

- Pose de la descente EP coté Sud en coordination avec la dépose des échafaudages

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.

Lot 4 :

- Restauration des portes et constat d'état de la voûte en voir en septembre



Lot 5 :

Lot 6 :




- Appareillage à présenter.



Vue du parement reconstruit coté intérieur et extérieur.

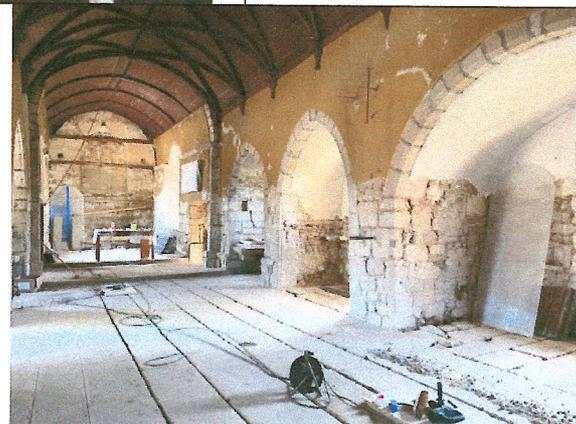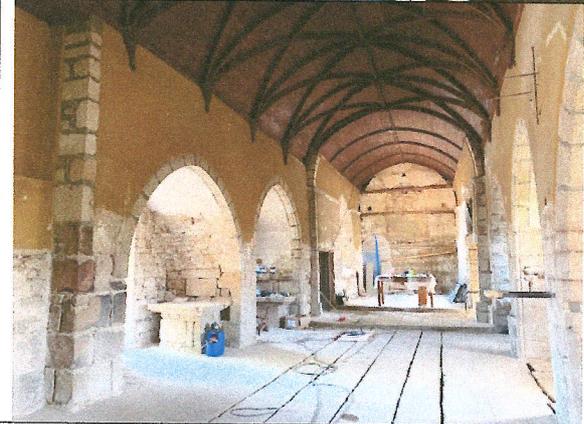


Vues de l'intérieur de l'édifice en cours de piquage des soubassements et des joints ciment compris dégarnissage du dallage en pierre

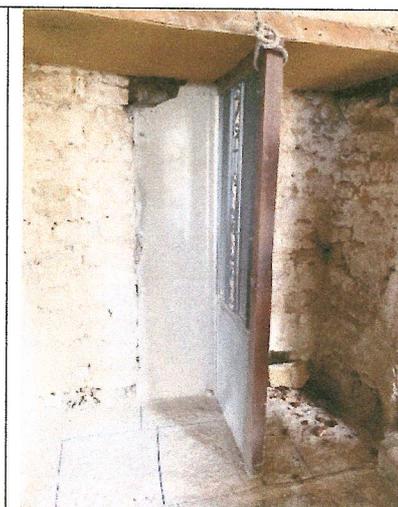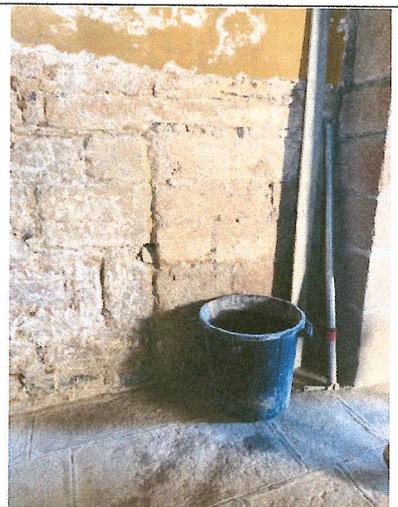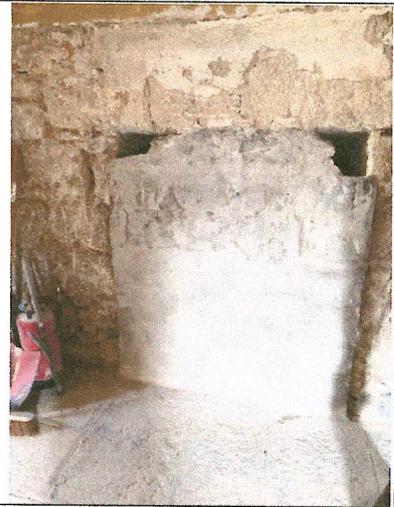


Vue de l'occultation en ciment à déposer

Percement muré à conserver

Ancien confessionnal masquant une ancienne arcade, à stabiliser : linteau bois vermoulu

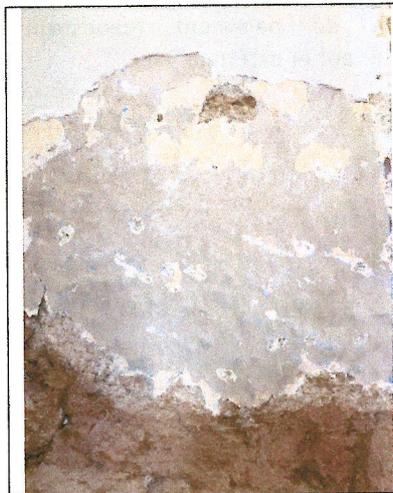

Vestiges de décors peints dans l'une des chapelles Sud

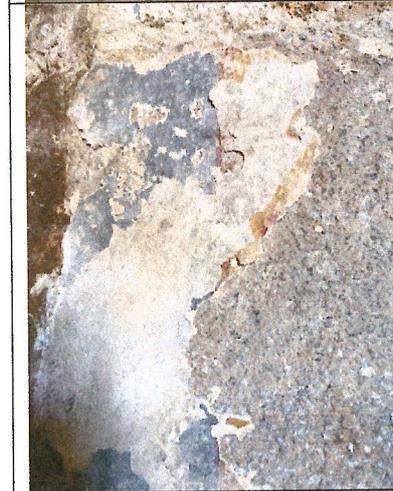

Vestiges de décors peints dans le chœur

