

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN				
<b>Maître d'ouvrage</b>		<b>Autorisation de travaux</b>		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000		
<b>Maître d'œuvre</b>		<b>Coordonnateur SPS</b>		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle		
<b>Entreprises</b>				
Lot n°1 Maçonnerie	SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture	SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux	SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie	SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité	DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC				
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°3 DU 30 JANVIER 2023		TRANSMIS LE 31 JANVIER 2023		
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 13 FEVRIER 2023 10H				
<b>Présents</b>	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>		
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants	
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle	
Mme Soulard Marie, Drac	X		Mme Soulard Marie, Drac	
M. Brière, Drac			M. Brière, Drac	
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)	
<b>Convoqués à la présente réunion</b>	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	<b>Convoqués à la prochaine réunion</b>	<i>oui non</i>
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X
Entreprise Soulier			Entreprise Soulier	X
Entreprise Martin LG			Entreprise Martin LG	X
Entreprise Graille			Entreprise Graille	
Entreprise Delestre			Entreprise Delestre	


**Maître d'Ouvrage :**

- La consultation pour la dépose du mobilier protégée a été effectuée
- En attente de l'arrêté de subvention relatif à la tranche optionnelle afin d'enclencher celle-ci

**Administratif :**

**Planning :**

- février :
  - Achèvement du drain
  - Finalisation du calepin pour réfection parement compris cubage et présentation échantillons
  - Début février : installation des échafaudages (coté Sud, échafaudages jusqu'à l'égout du clocher), protection des vitraux.
- Février/mars : révision de couverture, confortation de maçonnerie
- Fin Mars/avril : restauration des portes, repose du vitrail

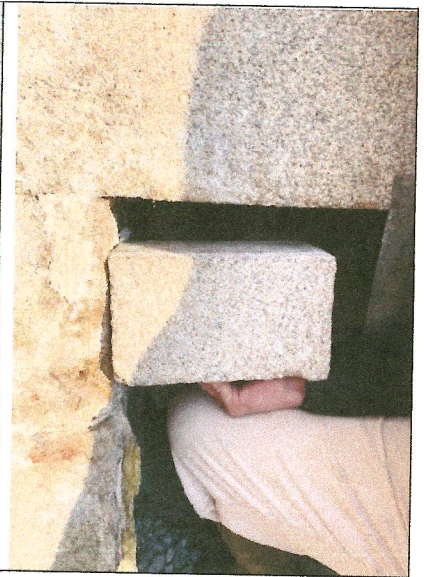

Vue du drain en cours de mise en œuvre et du socle rocheux conservé

Echantillon de pierre validé
