

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MIE EN VALEUR
INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN**

Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux			
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000			
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS			
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullés			
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie	SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE				
Lot n°2 Charpente Couverture	SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON				
Lot n°3 Vitraux	SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON				
Lot n°4 Menuiserie	SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE				
Lot n°5 électricité	DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue Francois Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE				
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°4 DU 20 FEVRIER 2023		TRANSMIS LE 21 FEVRIER 2023			
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE LUNDI 6 MARS 2023 A 10H					
Présents	Pres.	Abs			
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac	X		Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac			M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	oui	non
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier	X		Entreprise Soulier	X	
Entreprise Martin LG		X	Entreprise Martin LG		
Entreprise Graille			Entreprise Graille		
Entreprise Delestre			Entreprise Delestre		

Maître d'Ouvrage :

- La consultation pour la dépose du mobilier protégée a été effectuée
- Le petit mobilier déplacé à l'exception des deux chaises de servants et de l'harmonium
- En attente de l'arrêté de subvention relatif à la tranche optionnelle (complété par les devis relatifs aux vitraux) afin d'enclencher celle-ci

Administratif :

Planning :

- février :
 - Achèvement du drain
 - transmission du calepin pour réfection parement compris cubage
- Février/mars : révision de couverture, confortation de maçonnerie
- Fin Mars/avril : restauration des portes, repose du vitrail

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

- Clôture de chantier
- Installation du panneau de chantier (selon modèle validé)
- Démolition des appentis, dégagement des percements
- Evacuation de la chaudière par l'entreprise spécialisée
- Mise en œuvre du drain (hors solin delta MS)
- Présentation échantillons de pierre : carrière Faucher à Eyren, validé. Prévoir une taille fine.
- Purge du ciment coté extérieur du clocher au droit de la travée du chauffage
- Echnatillon de rejointoiement
- Installation des échafaudages au droit du clocher et de la façade Nord

Lot 3 :

- Dépose du vitrail Nord compris occultation

Lot 4 :

Lot 5 :

Lot 6 :

TRAVAUX A REALISER

Lot 1 :

- Mise en œuvre du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage.
- Finaliser le calepin pour obturation des percements compris cubage : faire apparaître le départ de l'arc. A noter que la pierre de corniche fracturée sera conservée au droit des capelles ainsi que les soubassements coté Ouest.
- Essais de rejointoiement : mortier un peu plus foncé + cran (ou arêne, sable granitique grossier).
- Nettoyage et rejointoiement revers chevet dans garage sous sacristie

Lot 2 :

- Approvisionnement en ardoises de complément et de tuiles pour le faîtage à prévoir.
- Révision en premier lieu du clocher compris nettoyage et démoissage. Vérifier les arêtiers en approche (à noter la présence de noquets). Présentation de crochets pour maintien de la gouttière (cuivre).
- Prévoir en suivant la révision de la nef et du chœur compris nettoyage et démoissage, réfection des solins et du faîtage : présenter tuile de couverture pour validation préalable. Le maçon fournira le mortier pour harmonisation).

Lot 3 :

- Restauration du vitrail Nord : à priori pas de casses. A noter qu'avant repose il conviendra de purger les solins cimentés au droit de l'encadrement prévu en T2), voire mise en œuvre d'une feuillure. Les barlottières seront conservées, les vergettes remplacées.
- **Protection des vitraux fin janvier (la protection a été réalisée par les maçons)**
- L'ouvrant du vitrail de la chapelle Sud/Ouest est affaissé, il conviendrait de le déposer et de transmettre un devis pour sa restauration ainsi qu'un devis complémentaire pour la purge des calfeutremments ciment au droit de l'ensemble des vitraux (hors vitrail Nord déposé).

Lot 4 :

- Restauration des portes en mars/avril

Lot 5 :



- Démarrage en T2 (prévoir intervention courant avril)

Lot 6 :

- Démarrage en T2 (courant avril)



Vue du ciment dgagé au droit du percement de l'ancien système de chauffage
Vue du fâitage décollé de la nef et du choeur

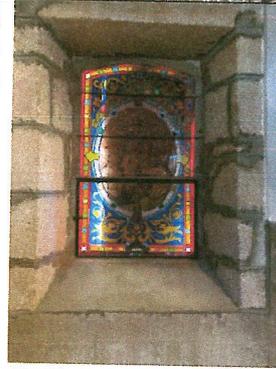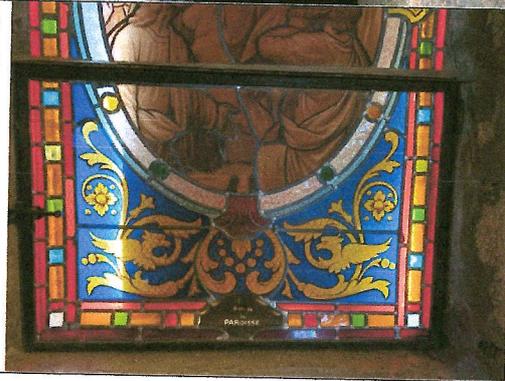

Vue du vitrail de la chapelle Sud/Ouest : le panneau de l'ouvrant est affaissé et déformé. Il faudrait le déposer rapidement.
