

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage		Autorisation de travaux			
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin		AT01918121C000			
Maître d'œuvre		Coordonnateur SPS			
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier		Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès			
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie		SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE			
Lot n°2 Charpente Couverture		SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON			
Lot n°3 Vitraux		SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON			
Lot n°4 Menuiserie		SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE			
Lot n°5 électricité		DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE			
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°23 DU 25 MARS 2024		TRANSMIS LE 25 MARS			
PROCHAINE REUNION :		LUNDI 22 AVRIL 10H – RECEPTION DES TRAVAUX			
Présents	Pres.	Abs			
M. Le Maire ou ses représentants	X		M. Le Maire ou ses représentants		
Mme Duchêne Gaëlle	X		Mme Duchêne Gaëlle		
Mme Soulard Marie, Drac			Mme Soulard Marie, Drac		
M. Brière, Drac	X		M. Brière, Drac		
M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)			M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)		
Convoqués à la présente réunion	Pres.	Abs	Convoqués à la prochaine réunion	oui	non
Entreprise Vermorel	X		Entreprise Vermorel	X	
Entreprise Soulier			Entreprise Soulier	X	
Entreprise Martin LG	X		Entreprise Martin LG	X	
Entreprise Graille	X		Entreprise Graille	X	
Entreprise Delestre	X		Entreprise Delestre	X	

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

- Rappel que le DOE doit être remis en 4 exemplaires dont 1 pour le maître d'ouvrage et 3 pour les services culturels de l'Etat + une version numérique

Planning :

Semaine 13 : repose des vitraux courant

Semaine 14 : achèvement des derniers travaux de maçonnerie

Semaine 15 :

Semaine 16 : pose de l'appareillage

Semaine 17 : réception des travaux

NB : repose du mobilier en mai sous réserve d'un taux hygrométrique satisfaisant.

TRAVAUX REALISES**Lot 1 :**

- Achèvement du rejointoiement en sol
- Passage pour alimentations depuis la sacristie
- Complément d'enduit au droit du clocher coté Sud

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

- Transmission du rapport de restauration
- Approvisionnement des vitraux et des raquettes.

Lot 4:

- Fabrication et présentation porte placard

Lot 5:

- Présentation du modèle de cache validé : Celiane Legrand blanc ivoire
- Installation des lustres
- Dépose alimentation extérieure
- Vérification alimentation au revers du retable

Lot 6 :

- Approvisionnement du chauffage sur mat de type Rouen, couleur crème



Vue du dallage rejointoyé, du lustre de la travée Ouest restauré et reposé et des appareillages de chauffage approvisionnés.

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 14 :

- Reprises de badigeon au droit du recoin Sud : badigeon blanc
- Remplacement de dallage en pierre dans le chœur et dans la travée Ouest,
- Dépose accroche alimentation électrique coté Sud

Lot 2 :

- Travaux achevés

Lot 3 :

Repose des vitraux compris raquettes :

- La grille de défense de la baie de la première chapelle Sud pourra être déposée, elle sera remise dans le clocher
- La grille de défense de la baie Ouest sera traitée au rustol mat
- La partie basse des vitraux au droit des bavette devra être masquée ou ternie
- Les raquettes de protection en cuivre seront posées au mu extérieur des baies à l'exception de la raquette de la baie Ouest qui sera posée au contact du chanfrein coté intérieur.





F4 : la grille de défense pourra être déposée et remise dans le clocher




Vues des vitraux Sud F6 et F8 (panneau bas ouvrant conservé).



Vues des vitraux Nord F3 et F5



F7 : la pièce fracturée a été conservée, collée et doublée

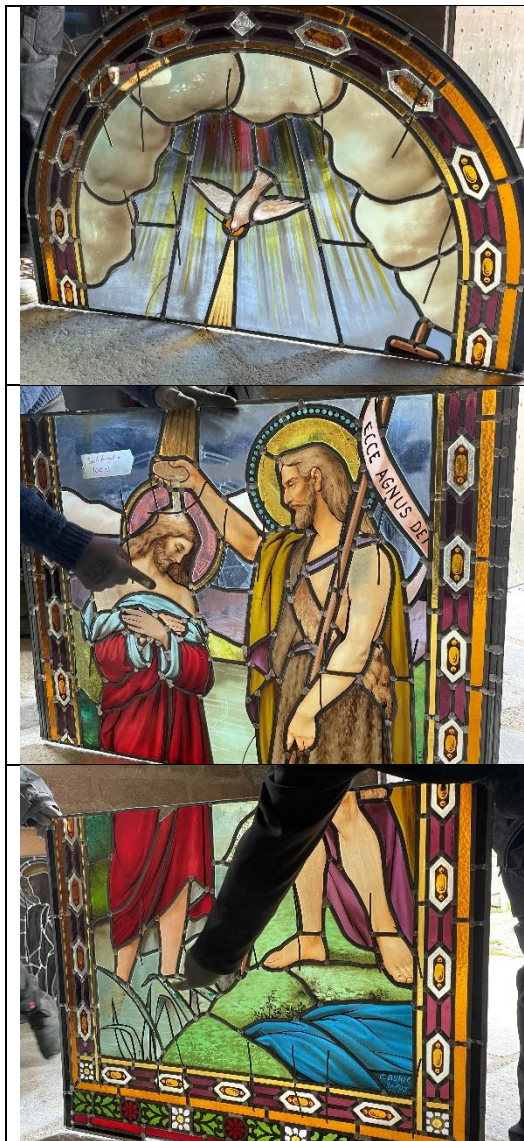

Vue du vitrail Ouest F9

Lot 4 :

- Restauration des portes à prévoir en avril, Colori pour mise en peinture à valider lors de la prochaine réunion de chantier : il est proposé un rouge Vauban, un brun abbaye ou un gris blanquenon de chez la Malouinière (<https://www.malouinieres.com/>). Concernant le portail Ouest, il est souhaité le maintien et la réparation du loquet existant ou son remplacement avec un modèle similaire, le verrou sera déposé, la serrure réparée en conservant le boîtier existant.
- Suite à validation, pose du placard, compris mise en teinte chêne moyen mat. M. Brière recommande l'utilisation de vis à tête fendue.



rouge Vauban

brun abbaye

gris blanquenon



Vue de la porte du placard présentée in situ (partie fixe de droite) compris échantillon. Le modèle de porte est validé. La mise en teinte apparaît un peu trop foncée et brillante : privilégier un ton chêne moyen mat. Pour la fixation des paumelle M. Brière recommande des vis à têtes fendues.

Portail Ouest : verrou à déposer et serrure à réparer compris conservation du boîtier.



Lot 5 :

- Pose de l'appareillage : Celiane Legrand blanc ivoire
- Pose spots
- Pose enceinte compris mise en peinture dito chauffage



Vues des lustres des chapelles restaurés et reposés

Lot 6 :

- Abaisser les mats de chauffage
