

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE MISE HORS D'EAU, DE CONFORTATION ET DE MISE EN VALEUR INTERIEURE - EGLISE DE SAINT AUGUSTIN					
Maître d'ouvrage			Autorisation de travaux		
Mairie De Saint Augustin Le Bourg 46930 Saint Augustin			AT01918121C000		
Maître d'œuvre			Coordonnateur SPS		
Gaëlle Duchêne - Architecte DPLG 16 Place Léon Gambetta, 46170 Castelnau Montratier			Jean-Michel LEYRAT 18 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tullès		
Entreprises					
Lot n°1 Maçonnerie			SAS VERMOREL ZA de l'Aéroport – La Cordenade 12330 SALLES LA SOURCE		
Lot n°2 Charpente Couverture			SARL SOULIER ZA Les Combes 19300 EGLETON		
Lot n°3 Vitraux			SARL Martin L.G 32 rue André Picaud 24300 NONTRON		
Lot n°4 Menuiserie			SARL GRAILLE Le Roc Blanc - 19800 CORREZE		
Lot n°5 électricité			DELESTRE INDUSTRIE ZI De La Bergerie - 2 Rue François Arago - BP10 49280 LA SEGUINIÈRE		
Lot n°6 chauffage IRC					
COMPTE-RENDU DE CHANTIER N°12 DU 25 SEPTEMBRE 2023			TRANSMIS LE 25 SEPTEMBRE		
PROCHAINE REUNION :			LUNDI 9 OCTOBRE 10H		
Présents	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>			
<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>	X		<i>M. Le Maire ou ses représentants</i>		
<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>	X		<i>Mme Duchêne Gaëlle</i>		
<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>			<i>Mme Soulard Marie, Drac</i>		
<i>M. Brière, Drac</i>			<i>M. Brière, Drac</i>		
<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>			<i>M. Moreno SPS (cabinet Leyrat)</i>		
Convoqués à la présente réunion	<i>Pres.</i>	<i>Abs</i>	Convoqués à la prochaine réunion	<i>oui</i>	<i>non</i>
<i>Entreprise Vermorel</i>	X		<i>Entreprise Vermorel</i>	X	
<i>Entreprise Soulier</i>			<i>Entreprise Soulier</i>		
<i>Entreprise Martin LG</i>	X		<i>Entreprise Martin LG</i>		
<i>Entreprise Graille</i>		X	<i>Entreprise Graille</i>	X	
<i>Entreprise Delestre</i>	X		<i>Entreprise Delestre</i>	X	

Maître d'Ouvrage :

Administratif :

Planning :

Semaines 39/40

- Achèvement des travaux extérieurs : drain, remise en état terrain, nettoyage et rejointoiement glacis Ouest
- Terminer le piquage des joints ciments au droit des arcatures
- Passage alimentations
- Mise en œuvre du gobetis suite passage d'alimentation

TRAVAUX REALISES

Lot 1 :

Tranche ferme :

- Pose des pierres au droit de l'élévation Sud du clocher et du glacis du contrefort,
- Nettoyage des glacis des contreforts Nord du clocher,

Tranche cond. :

- Piquage des soubassements ciment et purge des joints ciment au sol,
- Dépose habillage confessionnal pour mise au jour linteau bois dégradé compris étaieement, démolition doublage,
- Reconstruction du parement intérieur au droit des anciens percements du chauffage: le rejointoiement sera réalisé en cohérence avec l'ensemble du parement suite à piquage compris taille des arêtes et patine si besoin
- Piquage d'enduit au droit de la voûte de la travée Ouest
- Mise en œuvre échantillons badigeons

Lot 2 :

- Achèvement des révisions de couverture compris fourniture de gouttières et de descentes EP

Lot 3 :

- Dépose des vitraux compris occultation

Lot 4:

Lot 5:

- Dépose des installations électriques et des lustres,
- Transmission plan
- Présentation échantillon.

Lot 6 :

- Transmission plan
- Présentation documentation

TRAVAUX A REALISER

Lot 1:

Semaines 39/40

Tranche ferme :

- Nettoyage et rejointoiement glacis des contreforts Ouest
- Achèvement du drain : fixation du solin au droit du Delta MS avec des baguettes en galvanisé qui seront masquée par le remplissage.
- Replieement
- Remise en état du terrain
- Patine et complément rejointoiement coté Sud du clocher
- Glacis conreforts du chœur coté Nord.

Tranche cond. :

- Achever le piquage des joints ciment au droit des arcatures
- Façon de feuillures pour la repose des vitraux du chœur
- Saignées et percements pour le lot électricité
- Mise en œuvre gobettis suite au passage des alimentations.

Lot 2 :

- **Pose de la descente EP coté Sud**

Lot 3 :

- Transmettre constat d'état des vitraux.
- Repose des vitraux compris raquettes prévue en janvier.

- L'ouvrant bas de la chapelle Sud/Ouest sera conservée. Il est à noté que la mention « don de la paroisse » est éronée et doit être remplacée par la mention initiale selon documentation fournie par le MA
- L'ouvrant de la chapelle Sud/Est sera déposé.

Lot 4 :

- Confortation du linteau de l'ancien confessionnal
- Constat d'état de la voûte à voir lors de la prochaine réunion compris essais de nettoyage.
- Restauration des portes

Lot 5 :

Voir plans joints au présent CR

- Prévoir le passage des gaines en encastré à env. 10 m sous la corniche de la voûte
 - Chœur : 6 spots dont 3 destinés à éclairer le mobilier positionné derrière l'arc triomphal.
 - Nef : 8 spots, 4 directs et 4 indirects
 - Chapelle Sud/Ouest : 1 spot positionné au revers de l'arcature
 - Chapelles : lustres restaurés positionné au tiers extérieur
 - Travée Ouest : lustre + 1 spot au revers de l'arcature
- 1 commande sur détecteur pour les 5 lustres + 3 spots chœur destinés au mobilier + chapelle Sud/Ouest et travée Ouest
- 1 commande pour les 8 spots de la nef
- 1 commande pour les 3 spots restant du chœur.
- Eclairage de sécurité (prévoir les même qu'à Urval !! u = 2)
- Les prises seront à positionner : prévues 4
- Attentions aux enceintes : alimentation à prévoir.

Lot 6 :

- Appareillage à présenter.
- L'alimentation se fera en sol.



Cheminement des alimentations dans le choeur



Cheminement des alimentations dans la nef



Vue des spots prévus in situ (église d'Urval 24).



- ⊠ Enceinte
- Alimentation encastrée
- Spots orientables
- Chauffage IRC

Déplacement dans la sacristie du tableau électrique compris regroupement de l'ensemble des installations techniques


Fourniture et pose d'un chauffage amovible par IRC
Réfection de la sonorisation

Coupe longitudinale vers le Nord

Restauration des lustres

0 1 2 3 4 5 m

Eglise Paroissiale
Commune de Saint AUGUSTIN - Corrèze
Confortation, de mise hors d'eau et de restauration intérieure
EXE septembre 2023
G. Duchêne, architecte du Patrimoine DPLG




Plan du clocher

Réfection des installations électriques, mise en lumière
Fourniture et pose d'un chauffage amovible par IRC
Réfection de la sonorisation

Restauration des lustres

Déplacement dans la sacristie du tableau électrique et de l'ensemble des installations techniques

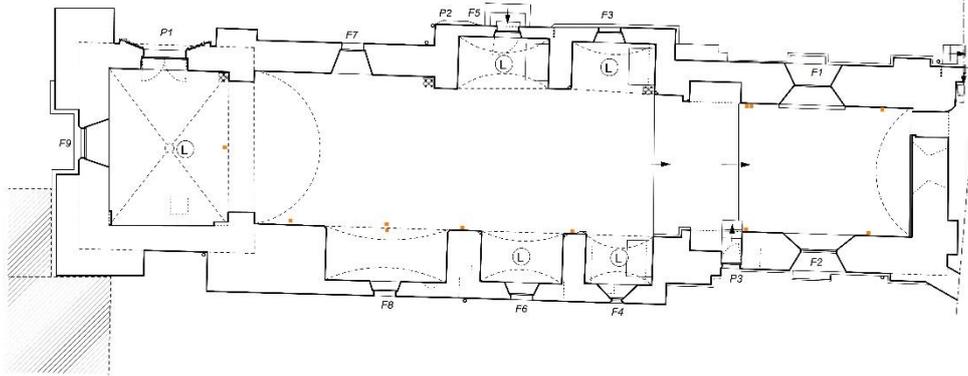

Plan au sol

0 1 2 3 4 5 m

Eglise Paroissiale
Commune de Saint AUGUSTIN - Corrèze
Confortation, de mise hors d'eau et de restauration intérieure
EXE septembre 2023
G. Duchêne, architecte du Patrimoine DPLG
